


N. ord.	fase	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Allestimento cantiere	0,00	10,00	10
2	B	Decespugliamento e demolizioni	10,00	30,00	20
3	C	Movimenti terra	30,00	60,00	30
4	D	Realizzazione della copertura (capping)	60,00	120,00	60
5	E	realizzazione del sitema di regimazione delle acque meteoriche	120,00	150,00	30
6	F	Sistemazione della recinzione perimetrale	150,00	170,00	20
7	G	smobilitazione Cantiere	170,00	180,00	10

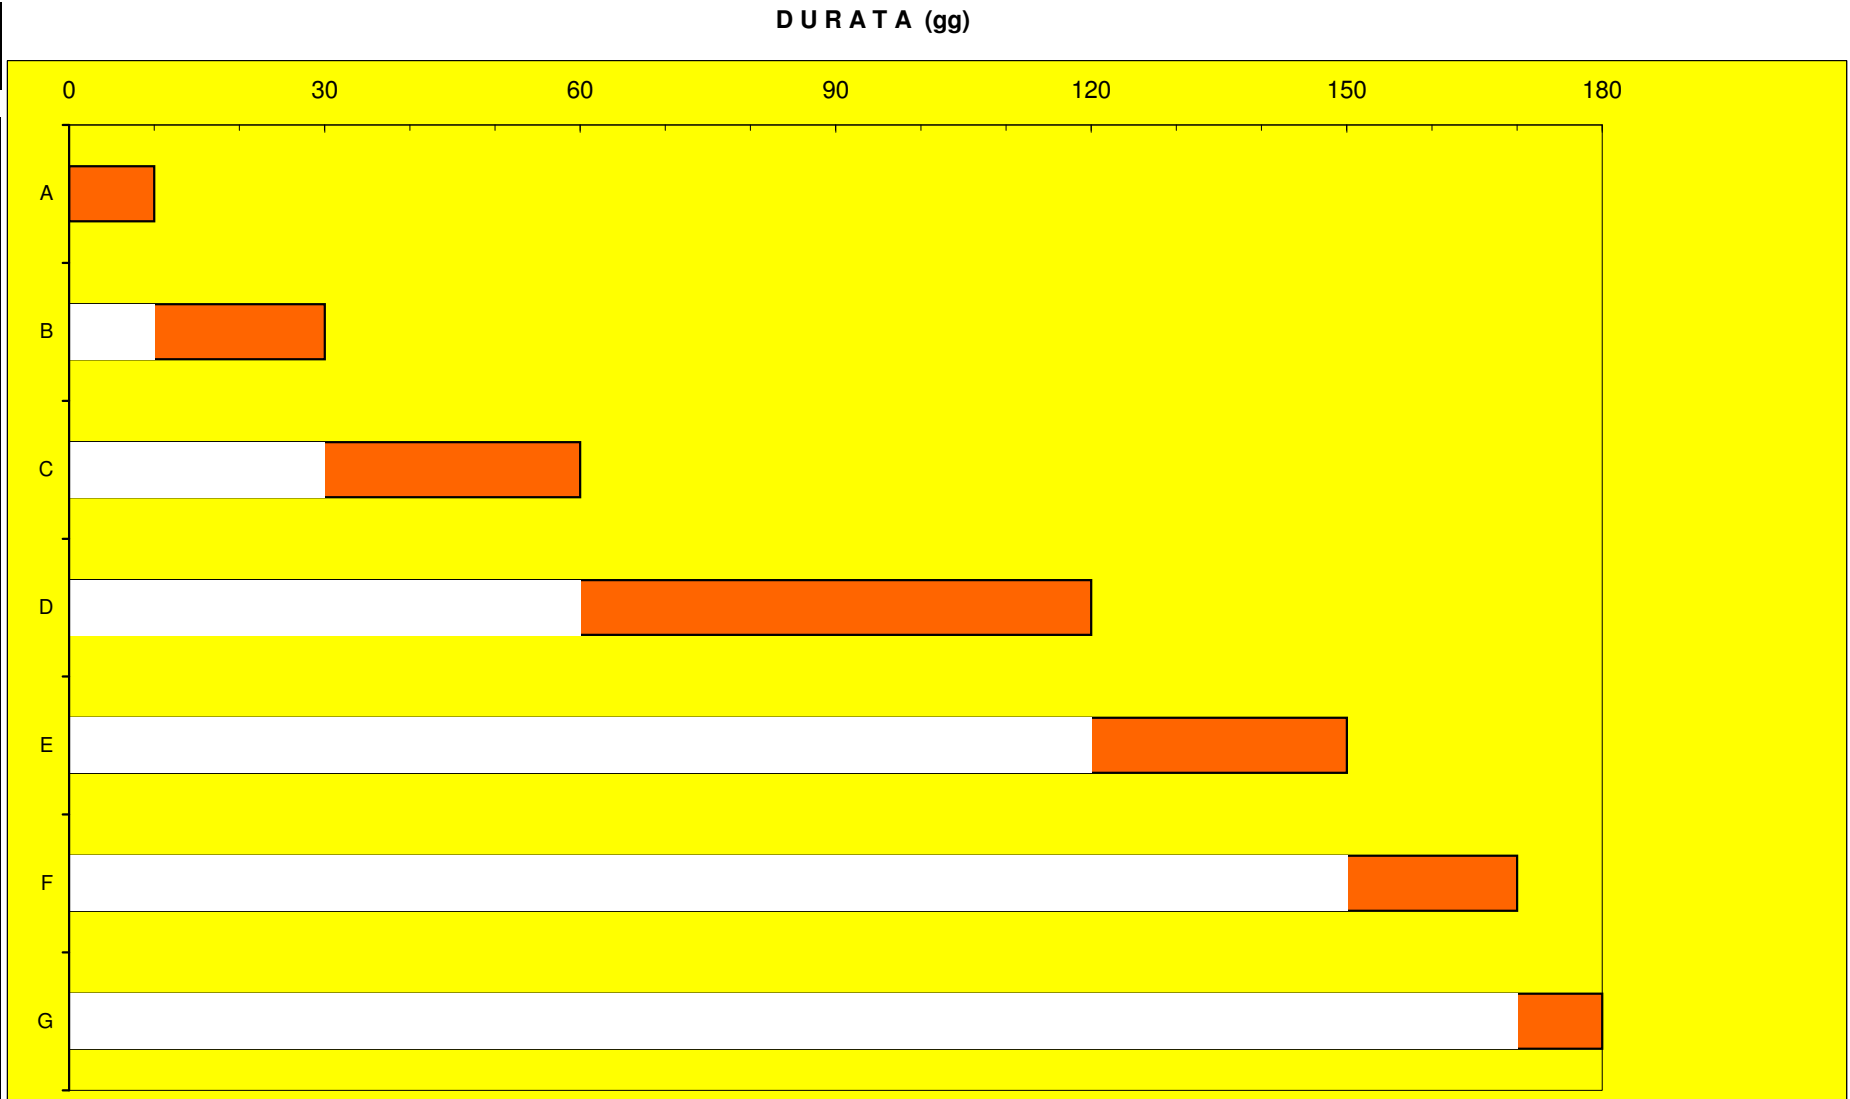

TC

180 gg.

giorni consecutivi

Inizio dei lavori

0 gg

Fine lavori

180 gg

dalla data di consegna
